



INFORME DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MES DE FEBRERO 2026

SANTA INES SUNRAY

Cliente	Revisión	Fecha Informe	Elaborado por
Biwo	0	01-03-2026	Gonzalo I. Villalobos G.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
	3
3. DESEMPEÑO MENSUAL	4
4. DISPONIBILIDAD MENSUAL	6
5. PLANIFICACIÓN	7
6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	8
6.1 Seguridad	8
6.2 Mantenimiento preventivo	8
6.3 Mantenimiento correctivo	8

1. INTRODUCCIÓN

En este informe mensual se presentan los hitos relevantes de la Operación y Mantenimiento del parque fotovoltaico Santa Ines Sunray de 9,23 MW, durante el mes de febrero 2026.

2. RESUMEN DE GENERACIÓN

La producción en el mes tuvo valores de generación de un 15,5% menor a lo esperado y de insolación de un 6,3% por debajo de lo esperado. No es posible calcular el valor de PR debido a las limitaciones que cuenta el parque.

A continuación, se presentan los indicadores de la planta.

Mes	Energía Medidor (MWh)	Energía Estimada (MWh)	Insolación inclinada (kWh/m2)	Insolación inclinada Estimada (kWh/m2)	PR (%)	PR Estimado (%)	Energía (%)		Insolación (%)		PR %	
octubre	1.702	1705	188,7	218	-	80,3%	-0,1%	●	-13,3%	●	-	-
noviembre	2.018	2291	297,0	306	-	77,0%	-11,9%	●	-9,7%	●	-	-
diciembre	2.145	2289	276,5	309	-	75,9%	-6,3%	●	-10,5%	●	-	-
enero	1.919	2404	265,7	334	-	77,3%	-15,5%	●	-6,4%	●	-	-
febrero	1.633	1933	253,1	270	-	76,6%	-15,55%	●	-6,4%	●	-	-
marzo		1860		244		81,8%						
abril		1166		157		79,7%						
mayo		803		102		84,2%						
junio		562		71		84,7%						
julio		736		93		85,0%						
agosto		896		113		84,8%						
septiembre		1269		161		84,7%						

Tabla N°1: Resumen de Generación Mensual año 1

Debido a la falta de refuerzo de la línea de distribución, el proyecto se encuentra limitado por fuerza mayor

Parque esta ajustado a 90% en el control de potencia

Existen intervalos de pérdidas de generación por problemas de comunicación de GPM+

Existe diversas desconexiones por PDOP y EF1+, donde se conversa con BIWO para aumentar la limitación de la planta, ya que las perturbaciones externas provocan aumentos de generación momentaneos por los cuales opera el parque.

3. DESEMPEÑO MENSUAL

En el siguiente cuadro se presentan los valores diarios obtenidos del mes

Dia	Energía Inversores (MWh)	Insolación (kWh/m2)	PR(%)
1	53,3	7,2	-
2	63,6	8,7	-
3	52,6	7,2	-
4	27,3	6,4	-
5	70,5	10,1	-
6	73,8	10,5	-
7	74,2	10,7	-
8	74,4	10,7	-
9	73,3	10,4	-
10	74,1	10,3	-
11	32,4	10,6	-
12	72,1	10,2	-
13	73,8	10,3	-
14	11,9	5,4	-
15	71,0	9,9	-
16	72,3	10,0	-
17	45,8	10,3	-
18	71,3	9,9	-
19	70,1	9,8	-
20	68,8	9,3	-
21	67,9	9,5	-
22	67,8	9,5	-
23	67,3	9,4	-
24	66,9	9,4	-
25	66,9	9,2	-
26	65,2	9,1	-
27	3,9	0,7	-
28	0,0	0,0	-
TOTAL	1.632,5	244,9	-

Tabla N°2: Resumen de desempeño diario.

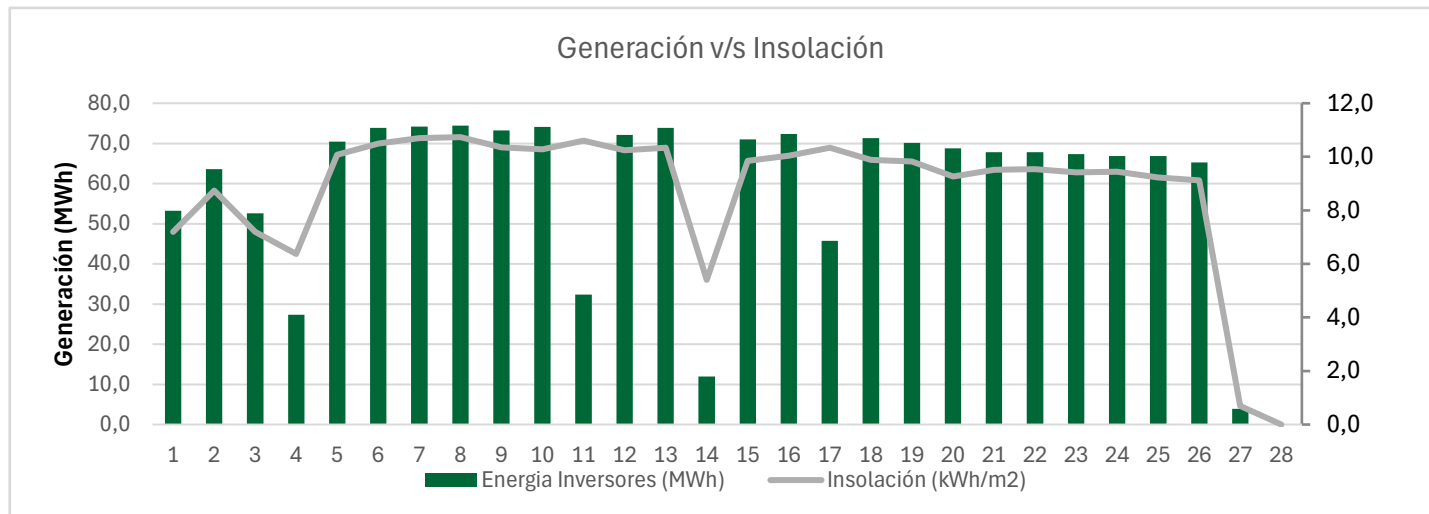


Grafico N°1: Generación v/s Insolación

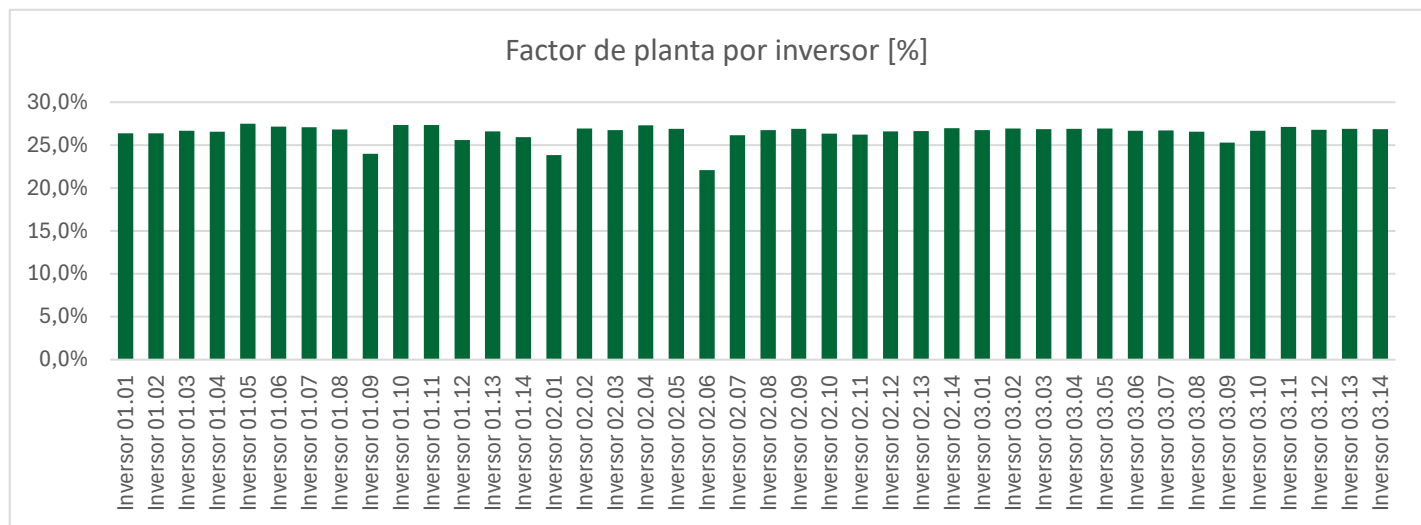


Gráfico N°2: Desempeño de Inversores.

Resumen factor de planta por inversor			
Mejor		Peor	
Inversor 01.05	27,5%	Inversor 02.06	22,1%
		Promedio	
		Desviación estándar	
		26,5%	
		1,02%	

4. DISPONIBILIDAD MENSUAL

En el siguiente cuadro se presenta la disponibilidad historica.

Mes	Disponibilidad (%)
oct-25	100,0%
nov-25	100,0%
dic-25	100,0%
ene-26	100,0%
feb-26	100,0%

Tabla N°3: Disponibilidad Anual.

Con relación a operaciones de reconector se registraron: 13

Inicio		Fin		Duración	Potencia MW	Energía MWh	Tipo	Origen	Comentario
Fecha	Hora	Fecha	Hora						
04-02-2026	10:02:38	04-02-2026	10:05:16	0,04	0,00	0,0	-	PDOP	Limitación de potencia
04-02-2026	10:43:55	04-02-2026	13:28:29	2,74	7,80	21,4	-	PDOP	Limitación de potencia
04-02-2026	13:44:09	04-02-2026	14:53:24	1,15	7,80	9,0	-	PDOP	Limitación de potencia
11-02-2026	8:54:27	11-02-2026	9:23:56	0,49	7,80	3,8	-	PDOP	Limitación de potencia
11-02-2026	9:40:42	11-02-2026	11:00:35	1,33	7,80	10,4	-	PDOP	Limitación de potencia
11-02-2026	11:00:35	11-02-2026	14:28:36	3,47	7,80	27,0	-	EF1+	Falla a tierra, equipo asiste a terreno
14-02-2026	8:26:41	14-02-2026	13:26:04	4,99	7,80	38,9	-	PDOP	Limitación de potencia
14-02-2026	14:11:12	14-02-2026	15:53:44	1,71	7,80	13,3	-	PDOP	Limitación de potencia
17-02-2026	11:22:25	17-02-2026	12:18:24	0,93	7,80	7,3	-	PDOP	Limitación de potencia
17-02-2026	12:18:24	17-02-2026	14:55:54	2,63	7,80	20,5	-	EF1+	Falla a tierra, equipo asiste a terreno
27-02-2026	8:08:36	27-02-2026	8:26:26	0,30	0,00	0,0	-	PDOP	Limitación de potencia
27-02-2026	8:26:26	27-02-2026	10:39:58	2,23	7,80	17,4	-	EF1+	Falla a tierra, equipo asiste a terreno
27-02-2026	10:39:58	02-03-2026	8:11:55	69,53	7,80	542,4	-	EF1+	Falla a tierra, equipo asiste a terreno

Tabla N°4: Registro de paradas de planta.

- Existen desconexiones prolongadas y constantes en los días 4/11/14/17/27 donde se presentan importantes pérdidas de generación en el parque.
- Actualmente el parque se encuentra con mayor limitación para evitar estas pérdidas constantes de generación.

5. PLANIFICACIÓN MENSUAL

En la siguiente tabla se presenta el avance de los trabajos respecto del 1er año de operaciones.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO STI		7	AÑO 01 - PMGD STI											
EQUIPO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
MÓDULO FV	INSPECCIÓN VISUAL (100% MÓDULOS)	ANUAL												
	INSPECCIÓN CABLES Y TERMINALES CC	ANUAL												
	LIMPIEZA DE PANELES (100% MÓDULOS)	TRIMESTRAL												
	TRAZADO DE CURVA IV	ANUAL												
SEGUIDORES	INSPECCIÓN VISUAL (100% DE LA ESTRUCTURA) + TOMAS A TIERRA	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE LAS MARCAS DE TORQUE	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE ANGULO OBJETIVO	CUATRIMESTRAL												
	CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO	CUATRIMESTRAL												
INVERSORES	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	COMUNICACIONES	SEMESTRAL												
	VENTILACIÓN	SEMESTRAL												
TRANSFORMADOR	INSPECCIÓN ELÉCTRICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL TRANSFORMADOR	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN CELDA MT	ANUAL												
	INSPECCIÓN CELDA DE BT	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE TIERRAS	CUATRIMESTRAL												
	MEDICIÓN DE TIERRAS (PAT)	ANUAL												
TABLEROS	COMUNICACIONES	CUATRIMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	FIJACIONES	SEMESTRAL												
PIRANOMETROS	CABLES Y FUSIBLES	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	ANUAL												
	CALIBRACIÓN DE PIRANOMETROS	BI - ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
EMITEO	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
LINEA MT	INSPECCIÓN VISUAL	ANUAL												
CROOM	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA RED MT	SEMESTRAL												
SEGURIDAD	INSPECCIÓN VISUAL + LIMPIEZA	SEMESTRAL												
GENERAL	SEGURIDAD (CCTV + CERCO PERIMETRAL)	MENSUAL												
	SEGURIDAD (CCTV)	ANUAL												
	LIMPIEZA SITIO	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE FOSAS	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE CALLES Y DESAGÜES	ANUAL												
	CONTROL DE VEGETACIÓN	CUATRIMESTRAL												

ESTATUS DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Mantenimiento de MVS: Retrasado por demora en lavado y priorización de desbroce.

Mantenimiento de Tablero: Termografías finalizadas; pendiente revisión de fijaciones y oxidación.

Trazado e Inspección: Se ejecutarán posterior al lavado de paneles.

Pendiente Anual CCTV: Programado para marzo (se incluirá en entrega de OT del mes).

Actividades en Curso: Se realiza desbroce en parque; próximamente lavado de paneles.

6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

6.1 Seguridad

Durante el período evaluado en el PFV Santa Inés Sunray (Biwo), todas las actividades en terreno se ejecutaron conforme a los procedimientos y lineamientos de seguridad establecidos por la compañía y por la normativa vigente. Las labores desarrolladas no implicaron maniobras de alto riesgo para el personal técnico y se realizaron utilizando los equipos de protección personal y controles operacionales definidos. No se registraron incidentes, accidentes ni condiciones inseguras asociadas a las tareas ejecutadas en el parque durante el periodo informado.

6.2 Mantenimiento preventivo

Durante el período evaluado, se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo correspondientes a la estación meteorológica (EMETEO) y la limpieza de piranómetros de las semanas S1, S2 y S3. Asimismo, se completó satisfactoriamente el mantenimiento mensual de CCTV y plataforma, asegurando la operatividad de los sistemas de vigilancia durante el mes de febrero.

Por otro lado, se informa que quedaron pendientes de ejecución los mantenimientos semestrales y cuatrimestrales de los centros de transformación CDT 01, CDT 02 y CDT 03, además del mantenimiento anual de CCTV y la limpieza de piranómetros de la semana S4. Estas actividades han sido reprogramadas para realizarse a la brevedad, con el objetivo de normalizar el plan de mantenimiento y garantizar la continuidad operativa y la integridad de los activos de potencia del parque.

6.3 Mantenimiento correctivo

Durante el mes se registro:

- Se sigue poniendo en marcha TK - 123. Falla que provenía desde el robo del parque
- Número de string y tracker asociado:
 - ST 1-123-14-2-7-8
 - ST 1-123-14-1-8-2
 - ST 1-123-14-3-6-14
- Existen problemas de comunicación con inversor 1.09 específicamente, ticket ya fue subido a Huawei

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO OT ASIGNADA

Codigo	Tarea	Planeado	Realizado	Inicio	Final	Hrs
OT-2994-22	EMETEO + Semanal S1 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	Yes	13-02-2026	13-02-2026	-
OT-2995-22	Anual CCTV PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	No	-	-	-
OT-2996-22	Mensual CCTV + Plataforma PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	Yes	13-02-2026	13-02-2026	-
OT-3048-22	Semestral + Cuatrimestral CDT 01 PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	No	-	-	-
OT-3049-22	Semestral + Cuatrimestral CDT 02 PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	No	-	-	-
OT-3050-22	Semestral + Cuatrimestral CDT 03 PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	No	-	-	-
OT-3182-22	Semanal S2 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	Yes	05-02-2026	05-02-2026	-
OT-3431-22	Semanal S3 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	Yes	05-02-2026	05-02-2026	-
OT-3430-22	Semanal S4 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)	Yes	No	-	-	-



EMETEO + Semanal S1 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)



Mensual CCTV + Plataforma PSF Sti (Feb26 Sti)



Mensual CCTV + Plataforma PSF Sti (Feb26 Sti)



Semanal S2 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)



Semanal S3 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)



Semanal S3 Piranometros PSF Sti (Feb26 Sti)
